

Cancún, Quintana Roo a 09 de mayo de 2019
OFICIO No. UCA/REC/217/2019
Asunto: Informe Mensual FAM 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DGESU
PRESENTE

En atención a su similar N° 511-3/2019.-0275, por este conducto, adjunto el informe mensual de la obra apoyada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 (FAM) correspondiente al mes de abril de 2019, bajo el siguiente esquema:

- Oficio original y archivo PDF.
- Formatos de los reportes de avance en formato digital.

Sin más por el momento, reciba saludos.

ATENTAMENTE
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"



DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA
RECTORA

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta- Director General de Educación Superior Universitaria
Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara.- Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. UNICARIBE
Ing. Albar Omar Fernández Hernández.- Jefe de Departamento de Servicios Generales e Infraestructura. UNICARIBE
Lic. Elizabeth Aranda García.- Jefa del Departamento de Control y Evaluación. UNICARIBE
Expediente/Minutario
APSF/RAMC/EAG/mgta

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Abril_2019
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad del Caribe**
Entidad federativa: Quintana Roo
Clave Inst 911: 23MSU0012E



RESPONSABLES

Nombre: **MTRO. RODRIGO A. MORALES CÁMARA**
Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 881 44 00 Ext 1226
Correo electrónico: rmorales@ucaribe.edu.mx

Nombre: **ING. ALBAR OMAR FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
Cargo: Jefe de Departamento de Servicios Generales e Infraestructura
Teléfono: 8814400 ext 1110
Correo electrónico: afernandez@ucaribe.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto laborable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con folios del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta Inquilino)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación o continuación del edificio 7G	X				\$ 25,018,955.42	\$	\$ 25,018,955.42				La institución ha entregado el proyecto al IFEQROO para su revisión.	La institución espera observaciones del Proyecto.				Con fecha 29 de abril se envía a través del oficio UCA/REC/0200/2019 el Proyecto del Edificio 7G para su revisión.							
									TOTAL	0	0.00													
						\$25,018,955.42	\$0.00	\$25,018,955.42																

DRA. ANA PRÍCILA SOSA FERREIRA

ING. ALBAR OMAR FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

¹ Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrá anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

Cancún, Quintana Roo a 07 de junio de 2019
OFICIO No. UCA/REC/353/2019
Asunto: Informe Mensual FAM 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DGESU
P R E S E N T E

En atención a su similar N° 511-3/2019.-0778, por este conducto, adjunto el informe mensual de la obra apoyada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 (FAM) correspondiente al mes de mayo de 2019, bajo el siguiente esquema:

- Oficio original y archivo PDF.
- Formatos de los reportes de avance en formato digital.

Sin más por el momento, reciba saludos.

A T E N T A M E N T E
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"



DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA
RECTORA

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta- Director General de Educación Superior Universitaria
Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara.-Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. UNICARIBE
Ing. Albar Omar Fernández Hernández.- Jefe de Departamento de Servicios Generales e Infraestructura. UNICARIBE
Lic. Elizabeth Aranda García.- Jefa del Departamento de Control y Evaluación. UNICARIBE
Expediente/Minutario
APSF/RAMC/EAG/mgta

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRICIDAD

1

Nombre de la obra:

Terminación o continuación del edificio 7G.




Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ARQUITECTÓNICO PLANTA PRIMER NIVEL NIV. +7.03

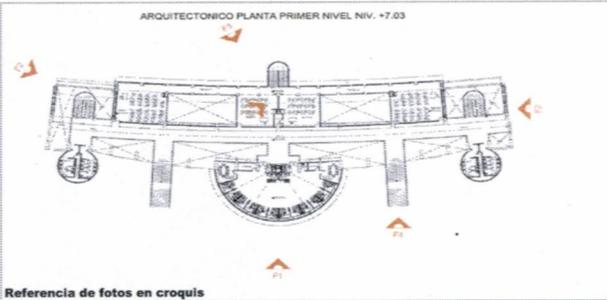

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, MZA.1, LOTE 1, SUPERMANZANA 78 ESQ. FRACCIONAMIENTO TABACHINES, CANCUN, QUINTANA ROO, C.P. 77528.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:



F3:



F4: E



F5: Interior de aula

Ana Prícila Sosa Ferreira
DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA

Alba Omar Fernández Hernández
ING. ALBA OMAR FERNANDEZ HERNANDEZ

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfica de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Mayo_2019
FOLIO DE CUOTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PERIODO

1


Nombre de la obra:

Terminacion o continuacion del edificio 7G.

CRUQUIS DE LOCALIZACION



ARQUITECTONICO PLANTA PRIMER NIVEL NOY. #7 23



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, MZA.1, LOTE 1,SUPERMANZANA 78 ESQ. FRACCIONAMIENTO TABACHINES, CANCUN, QUINTANA ROO, C.P. 77528.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:



F3:



F4:



F5:

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA

ING. ALBERTO FERNANDEZ HERNANDEZ

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



**Universidad
del Caribe**

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Cancún, Quintana Roo a 04 de julio de 2019
OFICIO No. UCA/REC/396/2019
Asunto: Informe Mensual FAM 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DGESU
PRESENTE

En atención a su similar N° 511-3/2019.-0963, por este conducto, adjunto el informe mensual de la obra apoyada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 (FAM) correspondiente al mes de junio de 2019, bajo el siguiente esquema:

- Oficio original y archivo PDF.
- Formatos de los reportes de avance en formato digital.

Sin más por el momento, reciba saludos.

ATENTAMENTE

"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"

DRA. ANA PRÍCILA SOSA FERREIRA
RECTORA

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez.- Subsecretario de Educación Superior
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta- Director General de Educación Superior Universitaria
Mtra. Rocío Chávez Mayo.- Subdirectora de Fomento Institucional. DGESU
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara.-Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional. UNICARIBE
Ing. Albar Omar Fernández Hernández.- Jefe de Departamento de Servicios Generales e Infraestructura. UNICARIBE
Lic. Elizabeth Aranda García.- Jefa del Departamento de Control y Evaluación. UNICARIBE
Expediente/Minutario
APSF/RAMC/EAG/mgta

Mza. 1, Lote 1, SM. 78, Esq. Fracc. Tabachines, Cancún, Quintana Roo, C.P. 77528
Tel: (998) 881-44-00 / www.unicaribe.edu.mx

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio 2019
FECHA DE SCRIBE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad del Caribe**
Entidad federativa: Quintana Roo
Clave Inst 911: 23MSU0012E

Nombre: **MTRO. RODRIGO A. MORALES CÁMARA**
Cargo: Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 881 44 00 Ext 1228
Correo electrónico: rmorales@ucaribe.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento
Nombre: **ING. ALBAR OMAR FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**
Cargo: Jefe de Departamento de Servicios Generales e Infraestructura
Teléfono: 881-4400 ext 1110
Correo electrónico: afernandez@ucaribe.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y recursos	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuenta y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta Inquilino)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación o continuación del edificio 7G	X					\$ 25,018,955.42	\$	\$ 25,018,955.42				La Institución entregó al IFEQROO la solventación de observaciones realizadas al Proyecto.	Se solicita una visita programada en sitio con el personal del IFEQROO en conjunto con la Institución para revisar situaciones no previstas con respecto a la ejecución del proyecto.			GLOBAL DEL PROYECTO	Mediante oficio número UCA/CA/0169/2019 envió la solventación de las observaciones al Proyecto Ejecutivo del Edificio "7 G".						
							\$25,018,955.42	\$0.00	\$25,018,955.42				TOTAL	0	0.00									

DRA. ANA PRÍCILA SOSA FERREIRA

ING. ALBAR OMAR FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

¹ Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Junio_2019
FECHA DE COPPEL:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Universidad del Caribe

Porcentaje de avance

0%

PROPIEDAD: 1

Nombre de la obra: **Terminación o continuación del edificio 7G.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

ARQUITECTÓNICO PLANTA PRIMER NIVEL NOV. 17.03

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, MZA.1, LOTE 1,SUPERMANZANA 78 ESQ. FRACCIONAMIENTO TABACHINES, CANCUN, QUINTANA ROO, C.P. 77528.



Comentarios de los trabajos realizados:



Dr. Priscila

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA

Alfonso

ING. ALFONSO GARCÍA PÉREZ HERNÁNDEZ

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio 2019

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

1


Nombre de la obra:

Terminación o continuación del edificio 7G.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ARQUITECTÓNICO PLANTA PRIMER NIVEL NIV. +7.03



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE, MZA.1, LOTE 1, SUPERMANZANA 78 ESQ. FRACCIONAMIENTO TABACHINES, CANCUN, QUINTANA ROO, C.P. 77528.

FOTOS



F1:



F2:


Comentarios de los trabajos realizados:



F3:



F4: E

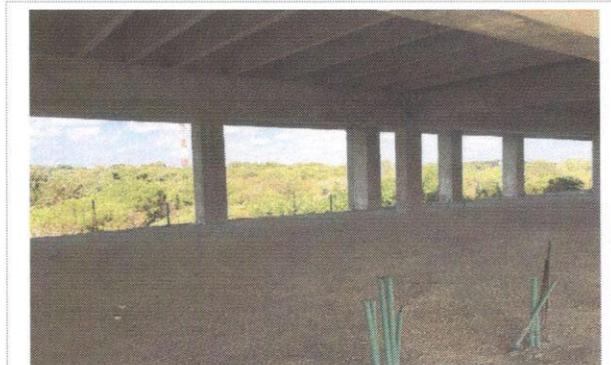

F5: Interior de aula

Ana Pricila Sosa Ferreira

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA

Albano Omar Fernandez Hernandez

ING. ALBANO OMAR FERNANDEZ HERNANDEZ

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
